



ARI 2022


REGIÓN DEL BIO BIO

MAYO 2019

CARTERA DE INVERSION PROVINCIA DE CONCEPCION SERVICIO DE SALUD CONCEPCION

Estado cartera de inversiones Concepción

● TERMINADO ● EN CONSTRUCCIÓN ● EN LICITACIÓN ● ESTUDIO/DISEÑO

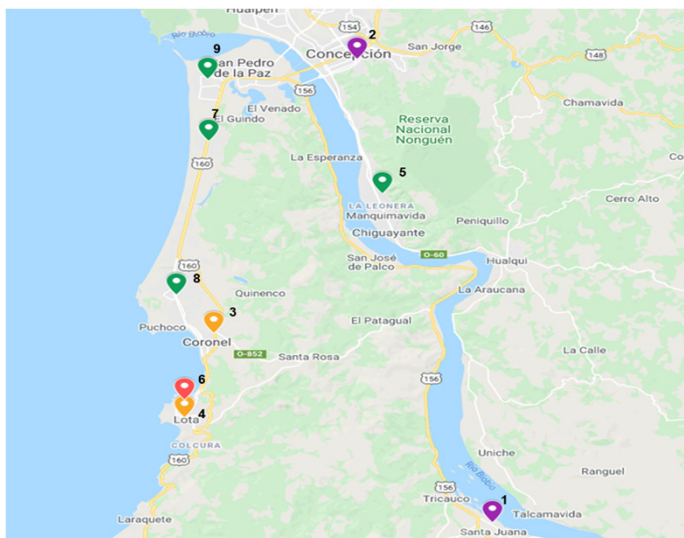

HOSPITALES

- 1 Hospital de Santa Juana
- 2 Hospital Guillermo Grant Benavente, Concepción
- 3 Hospital de Coronel
- 4 Hospital de Lota

CESFAM

- 5 CESFAM Valle la Piedra, Chiguayante
- 6 CESFAM Lota Alto
- 7 CESFAM Loma Colorada, San Pedro de la Paz

SAR

- 8 SAR Carlos Pinto, Coronel
- 9 SAR Boca Sur, San Pedro de la Paz

Proyecto	Solicitado 2021	Total M\$
H. Santa Juana	54.500	54.500
HGGB	322.000	417.079
CESFAM Valle la Piedra	341.678	3.754.383
CESFAM Lota Alto	3.689.210	6.129.458
SAR Carlos Pinto	256.421	1.415.980
Conservación Infraestructura	1.727.974	1.727.974
SAR Boca Sur		1.288.704
CESFAM Loma Colorada		2.958.785
TOTAL M\$	6.391.783	17.746.863

Iniciativa	Estado de Avance
Hospital de Santa Juana	Se cuenta con RS y a espera que CORE asigne fondos a esta iniciativa para termino de etapa de prefactibilidad.
Hospital GG Benavente	Con RS Prefactibilidad y con Adjudicación de Consultora para el desarrollo del Estudio.
Hospital de Coronel	En proceso de Licitación con apertura técnica de ofertas
Hospital de Lota	En proceso de Licitación con apertura técnica de ofertas
CESFAM Valle La Piedra	100% Avance obras Civiles y en proceso de Autorización Sanitaria
CESFAM Lota Alto	Avance 87% en obras civiles Se espera término en Septiembre de 2021
CESFAM Lomas Coloradas	En plena Operación
SAR Carlos Pinto	100% Avance Obras Civiles y en proceso de habilitación Equipamiento
SAR Boca Sur	En plena Operación
Programa Conservación 2018-2022	EN proceso de licitación APS, y en postulación a recursos Hospitalaria

ARI 2022 PROVINCIA DE CONCEPCION

SERVICIO DE SALUD CONCEPCION 2022

Nombre de la Iniciativa	Etapas	Costo Total	Gasto Esperado al 31/12/2021	Solicitado 2022	Saldo Prox. Años
REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CHIGUAYANTE	EJECUCIÓN	3.535.741.000	35.741.000	2.100.000.000	1.400.000.000
MEJORAMIENTO ÁREA IMAGENOLOGIA COMPLEJA HGGB	EJECUCIÓN	3.480.212.000	1.432.223.600	2.047.988.400	0
REPOSICION SERVICIO QUEMADOS, HGGB	EJECUCIÓN	2.660.191.000	0	2,660,191.000	0
REPOSICIÓN HOSPITAL DE SANTA JUANA	DISEÑO	304.500.000	54.500.000	250.000.000	0
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PALOMARES CONCEPCION	DISEÑO	25.000.000	0	25.000.000	0
CONSTRUCCION CENTRO ONCOLOGICO S.S CONCEPCION	DISEÑO	26.500.000	0	26.500.000	0
NORMALIZACION HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE CONCEPCION	EPH	417.079.000	130.000.000	287.079.000	0
CONSTRUCCION CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS SERVICIO SALUD CONCEPCION	DISEÑO	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000
CONSTRUCCIÓN SALA DE REHABILITACIÓN, CESFAM VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ	EJECUCIÓN	232.472.000	0	232.472.000	0
TOTAL		10.706.695.000	1.652.464.600	7.654.230.400	1.425.000.000
